

QUY TRÌNH GIÁM SÁT

Thi công chống thấm mái gạch đỏ lộ thiên sử dụng **Neoproof® PU Fiber**



A. KHÂU CHUẨN BỊ

Bước 1: Kiểm tra mặt bằng

- Mái gạch đỏ cần mài chà xước bề mặt và vệ sinh sạch sẽ.
- Bề mặt phải sạch sẽ không lồi lõm (Trám vá khe nứt bằng keo **BS 8620S** và vữa sửa chữa **Neorep Rapid**)



Bề mặt gạch chưa đạt



Vệ sinh bề mặt gạch



Keo trám khe **BS 8620S**



Bề mặt gạch đạt

Bề mặt gạch chưa được trà sần

Bề mặt gạch đã được trà sần

Lý do:

.....

Ký xác nhận

Bước 2: Đo độ ẩm của bê tông bằng máy đo độ ẩm



Độ ẩm bề mặt gạch $\geq 4\%$ chưa đạt

Độ ẩm bề mặt gạch $<4\%$ đạt

Lý do:

.....

Ký xác nhận

Bước 3: Kiểm tra thời tiết không mưa trong vòng 7 ngày.



Thời tiết dự báo có mưa



Thời tiết nắng

Lý do:


.....

Ký xác nhận

Bước 4: Chuẩn bị dụng cụ thi công

			
Revinox® / Silatex® Primer	Keo trám khe - BS 8620S	Jointex® – Matít Acrylic chít khe	Vải không dệt Neotextile®
			
Vữa sửa chữa - Neorep Rapid	Chổi quét - Con lăn	Máy khuấy	

Bản vẽ mặt cắt cấu tạo hệ thống

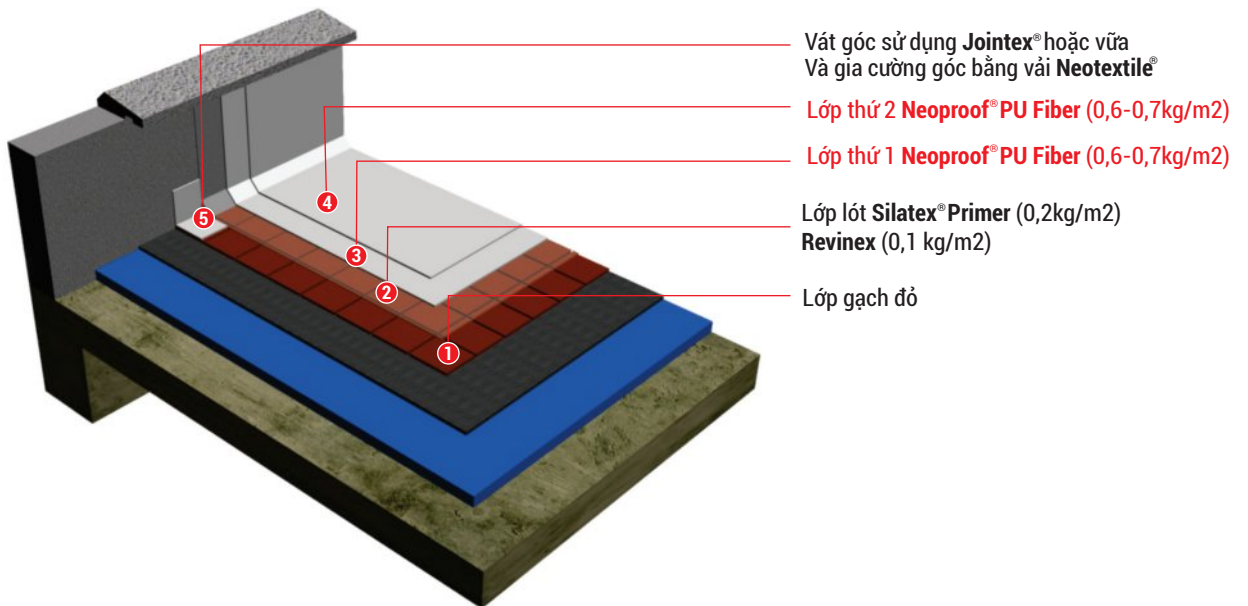

B. TRIỂN KHAI THI CÔNG

Bước 1: Vật liệu lót Primer và vật liệu chính Neoproof® PU Fiber phải được khuấy bằng máy khuấy tốc độ chậm trong vòng 3 phút trước khi thi công.

Khuấy chưa đủ thời gian

Khuấy đã đủ thời gian

Lý do:

Ký xác nhận

Bước 2: Thi công lớp lót Primer và để khô trong vòng 3 - 4h nhiệt độ 25°C

Chưa đủ thời gian

Đã đủ thời gian

Lý do:

.....

Ký xác nhận

Bước 3: Thi công lớp phủ thứ nhất bằng chổi quét hoặc lăn Rulo và để khô

Bước 4: Thi công lớp phủ thứ 2 sau 24h bằng chổi quét hoặc lăn rulo vuông góc với lớp 1

Bước 5: Có thể lặp lại với các lớp tiếp theo. (Tham khảo thêm tài liệu kỹ thuật kèm theo)

Chưa đủ thời gian

Đã đủ thời gian

Lý do:

.....

Ký xác nhận

LƯU Ý:

- Sản phẩm sẽ khô sau 7 ngày (Không được test nước trong khi sản phẩm chưa khô hoàn toàn)
- Để tăng tuổi thọ công trình **Neoproof® PU Fiber** có thể thi công nhiều lớp tùy theo định mức từ 1,2 kg - 1,4 kg/m². (Theo bảng công bố tuổi thọ sản phẩm)

Đơn vị thi công
GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư
GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Lưu ý:

1. Các bước thi công phải được ký xác nhận của giám sát khi chuyển bước tiếp theo.
2. Các công đoạn thi công phải được chụp ảnh để lưu hồ sơ, làm cơ sở công ty cấp phiếu bảo hành công trình.
